

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO ESECUTIVO

Rifacimento della copertura ed adeguamento alla normativa antincendio della palestra comunale

Elaborato:

PROGRAMMA DEI LAVORI

NR. TAVOLA

H

COMMITTENTE:

COMUNE DI OLMEDO

Corso J.F. Kennedy, 26 - 07040 Olmedo (SS)

visto del R.U.P. e/o del Committente

timbro e firma del Progettista

data:

Il Progettista:

Dr. Ing. Antonio Piu

via Brigata Sassari, 4 - 07030 Chiaramonti (SS)


tel. 349 6801385 - fax 079 569241

ant.piu@gmail.com - antonio.piu@ingpec.eu

ID	Nome Attività	Durata (g)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 - COPERTURE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	70g	█																		
2	2 - OPERE EDILI	83g				█															
3	3 - INFISSI	35g			█				█									█			
4	4 - SANITARI	35g			█					█											
5	5 - IMPIANTO ELETTRICO	35g				█													█		
6	6 - IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA	42g						█								█					
7	7 - IMPIANTO ANTINCENDIO E SEGNALETICA	28g				█														█	
8	8 - ARREDI E OPERE DI VARIA NATURA	63g									█										
9	C.SIC - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta.	120g	█																		

DESCRIZIONE	ricavi	da 1 a 27	da 28 a 44	da 45 a 62	da 63 a 111	da 112 a 120	
1 - COPERTURE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE	€ 95.100,00	€ 36.681,43	€ 23.095,71	€ 24.454,29	€ 10.868,57		
2 - OPERE EDILI	€ 11.500,00	€ 692,77	€ 2.355,42	€ 2.493,98	€ 5.957,83		
3 - INFISSI	€ 12.000,00	€ 2.400,00	€ 685,71	€ 4.114,29	€ 4.457,14	€ 342,86	
4 - SANITARI	€ 10.700,00	€ 3.974,29	€ 305,71	€ 3.974,29	€ 2.445,71		
5 - IMPIANTO ELETTRICO	€ 25.500,00	€ 4.371,43	€ 12.385,71	€ 3.642,86	€ 4.371,43	€ 728,57	
6 - IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA	€ 25.500,00		€ 5.464,29	€ 10.928,57	€ 9.107,14		
7 - IMPIANTO ANTINCENDIO E SEGNALETICA	€ 16.800,00	€ 3.600,00	€ 9.000,00			€ 4.200,00	
8 - ARREDI E OPERE DI VARIA NATURA	€ 16.400,00			€ 1.561,90	€ 12.755,56	€ 2.082,54	
C.SIC - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso d'asta.	€ 3.000,00	€ 675,00	€ 425,00	€ 450,00	€ 1.225,00	€ 225,00	
IMPORTO		€ 52.394,92	€ 53.717,55	€ 51.620,18	€ 51.188,38	€ 7.578,97	
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 52.394,92	€ 106.112,47	€ 157.732,65	€ 208.921,03	€ 216.500,00	
%		24,20	24,81	23,84	23,64	3,50	
% PROGRESSIVA		24,20	49,01	72,86	96,50	100,00	

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
	27	27	€ 52.394,92	€ 52.394,92	24,20	Si
	44	17	€ 106.112,48	€ 53.717,56	49,01	Si
	62	18	€ 157.732,65	€ 51.620,17	72,86	Si
	111	49	€ 208.921,01	€ 51.188,36	96,50	Si
	120	9	€ 216.500,00	€ 7.578,99	100,00	Si

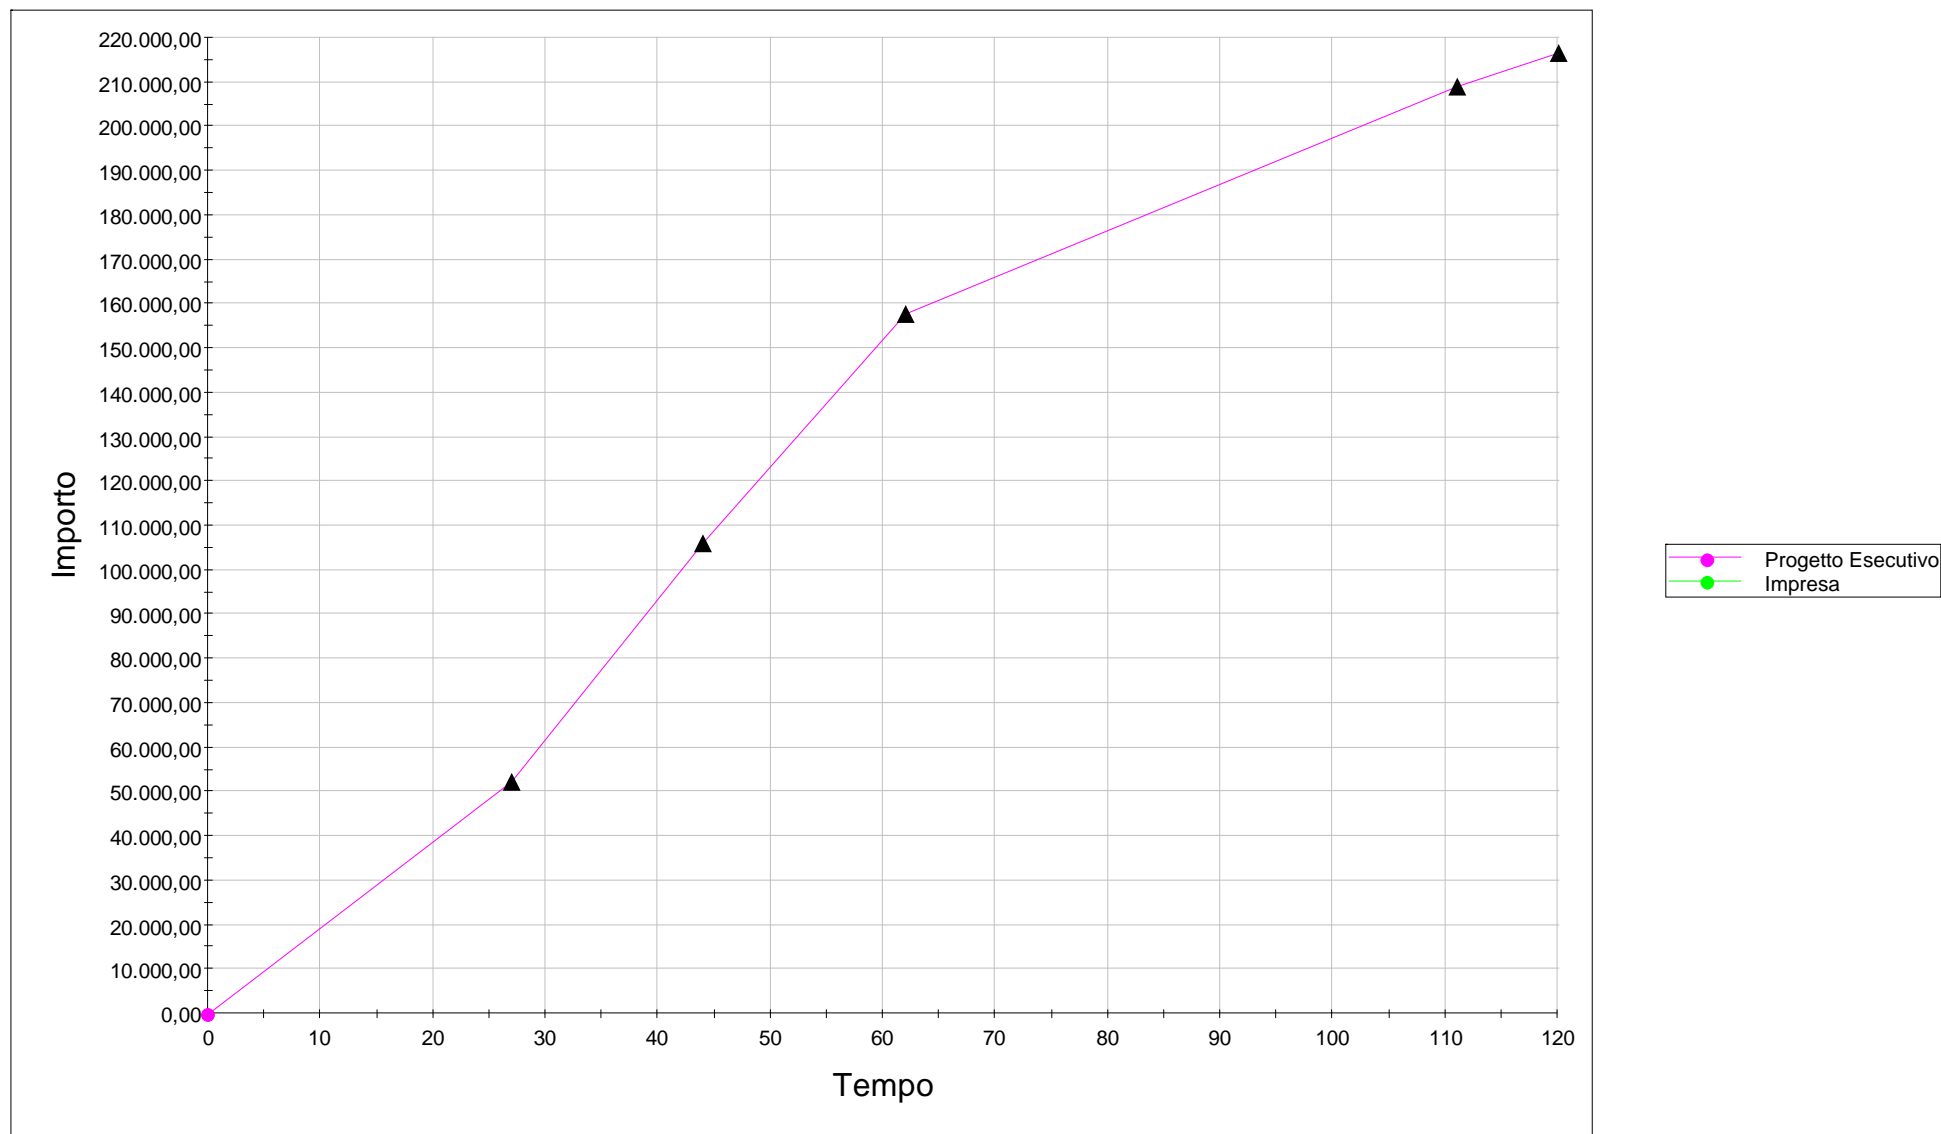

LEGENDA

- ▲ punto che delimita periodi a media di produzione costante
- ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
